



Utarbeidet av
Ingrid Bøe og Ingrid Slettmoen


Foreløpig gjennomføringsplan

Dato	Aktivitet
Medio januar 2026	Kunngjøring av konkurransen (prekvalifisering)
Medio februar 2026	Søknadsfrist prekvalifisering
Mars 2026	Utsendelse av resultat prekvalifisering og invitasjon til konkurranse og teamevaluering
Medio april 2026	Tilbudsfrist
Uke 17/18	Forhandlingsmøter og teamevaluering
Mai 2026	Tilbudsfrist revidert tilbud
Medio mai 2026	Meddelelse om kontraktinnstilling
Juni 2026	Karensperioden utløper
Juni 2026	Kontraktinggåelse og oppstart fase 1
12 - 15 måneder	Prosjektutviklingsfase
Høst 2027	Vedtak om fase 2
Høst 2027	Tentativ oppstart fase 2
2027 – 2029	Anslått byggetid

Samspillsorganisasjon

Organisering og beslutninger

Forenklet samspillsorganisasjon – roller og beslutningsmyndighet

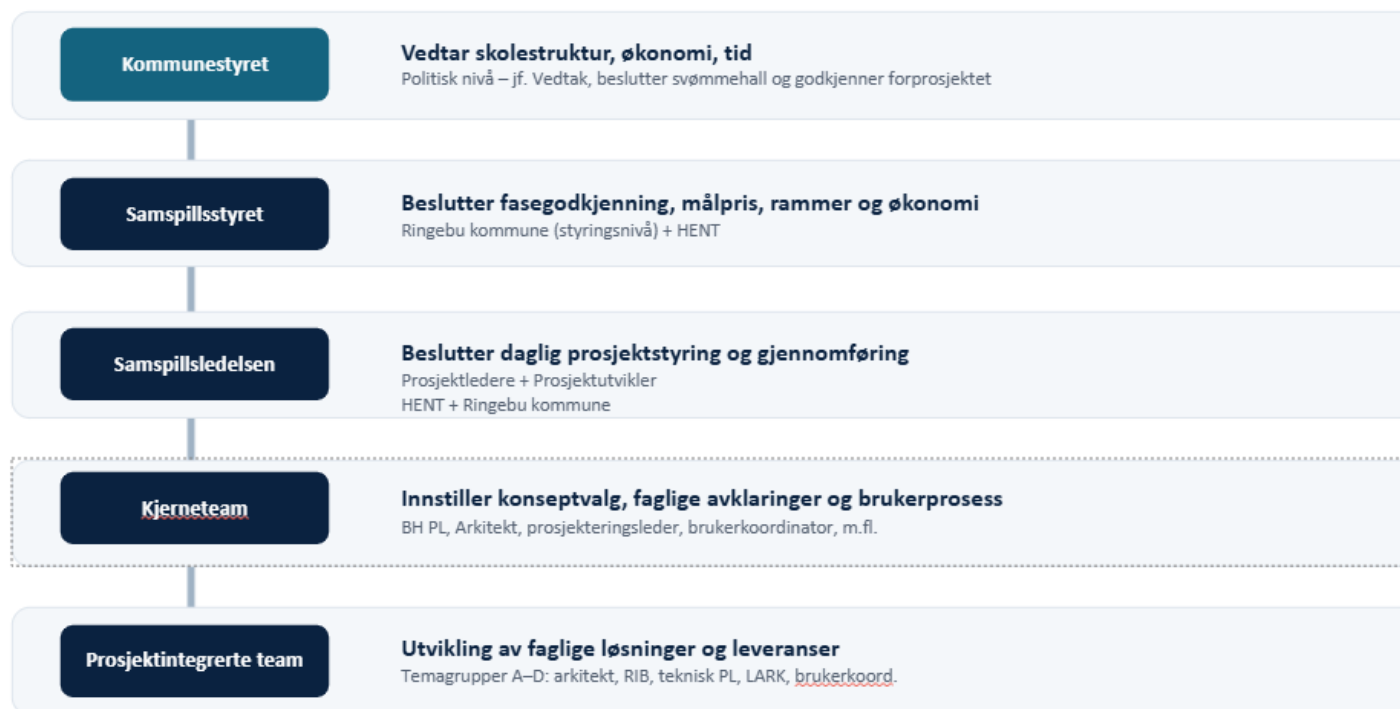

Veien videre – prosjektutviklingsfase

- Avtale med Hent AS er signert 10.06.
- Skolene er besiktiget for å vurdere evt. gjenbruk/ombruk
- Samling med alle ansatte i skolene 14. august er gjennomført

Forventinger fra lærerne til denne dagen:

Hvilke forventninger har du til brukerprosessen for skoleutbygging Fåvang/Ringebu?

Click to add text



Veien videre – prosjektutviklingsfase, forts.

- Oppstart av reguleringsplanarbeidet er varslet.
Arkitekt (HUS Arkitekter AS som er underleverandør til Hent AS på dette fagområdet) og kommunens planavdeling jobber med dette.
- Det har vært samling i kjerneteamet, samt flere møter i prosjektintegreerte team.
- Det er nedsatt ei brukergruppe, disse er i gang med workshops; se på rombehov og plassering

Veien videre – prosjektutviklingsfase, forts.

- Alle ansatte har besøkt nye Sør-Fron skole
- Brukergruppen skal besiktige tre skoler i Trøndelag
- Barneskolene planlegger besøk på Otta skole
- Kjerneteam og prosjektintegreerte team har jevnlige arbeidsmøter



Utfordringer

- Elevtall

Hvilke elevtall skal skolene dimensjoneres for?

- Romprogram

Hvilke og hvor mange rom trenger vi?

Hvor mange skal det være plass til i rommene?

Skal kulturskolen inn i 1-10 skolen?

Skal det bygges opplæringsbasseng ved 1-10-skolen?

- Kostnader/økonomi/budsjett



Elevtall

ELEVTALESUTVIKLING										
	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32
Ringebu	123	127	136	165	184	184	154	161	168	175
Fåvang	129	120	109	128	119	117	129	130	126	121
Ungdomsskolen	141	139	140	137	131	131	127	130	113	103
Sum:	393	386	385	430	434	432	410	421	407	399

25/26			26/27			27/28			28/29			29/30			30/31			31/32		
Fåvang	Ringebu	RUS	Fåvang	Ringebu	RUS	Fåvang	Ringebu	RUS	Fåvang	Ringebu	RUS	Fåvang	Ringebu	RUS	Fåvang	Ringebu	RUS	Fåvang	Ringebu	RUS
21	18		13	35		19	29		16	27		24	24		16	20		14	18	
15	22		21	18		13	35		19	29		16	27		24	24		16	20	
17	23		15	22		21	18		13	35		19	29		16	27		24	24	
17	32		17	23		15	22		19	22		13	35		19	29		16	27	
15	25		17	32		17	23		19	11		19	22		13	35		19	29	
22	29		15	25		17	32		20	13		19	11		19	22		13	35	
21	16		21	29		15	25		23	17		20	13		19	11		19	22	
		44			37			50			40			40			33			30
		50			44			37			50			40			40			33
		43			50			44			37			50			40			40
128	165	137	119	184	131	117	184	131	129	154	127	130	161	130	126	168	113	121	175	103
Ringebu 1.-10.		302			315			315			281			291			281			278

Romprogram

RINGEBU 1 - 10 SKOLE - ROMPROGRAM

DIMENSJONERINGSGRUNNLAG ANTALL ELEVER

Valgt elevantall for dimensjonering av læringsareal	Antall personer	Snitt pr. trinn	Personer pr. wc	Antall wc
Barnetrinn	115	29	20	6
Mellomtrinn	86	29	20	4
Ungdomstrinn	130	43	20	7
Personale	56		15	4
SUM	387			20

ROMTYPE	ANTALL ELEVER / LÆRERE	AREAL PR. ELEV / LÆRER	AREAL PR. ROM	ANTALL ROM
GENERELT LÆRINGSAREAL				
1. - 4. TRINN				
BASEAREALER				
Klasserom 1	30	2,45	74	
Klasserom 3	25	2,45	61	
Klasserom 4	20	2,45	49	

Kostnader/økonomi/budsjett

Antatt arealbehov som WSP har lagt til grunn, ser ikke ut til å samsvare med det arealbehov vi har kommet frem til. Avvik skyldes i stor grad at vi legger dagens elevtall og behov til grunn.

Arealbehovet påvirker kostnadene!

Derfor viktig at romprogrammet bestemmes, da dette vil gi grunnlag for Hent sitt arbeid med å utarbeide kostnadsoverslag for prosjektet.

Viktige avklaringer fremover

- Skal det planlegges for et nytt opplæringsbasseng ved Ringebu-skolen?
- Skal kulturskolen inn i Ringebu-skolen?

Viktig at dette blir avklart så raskt som mulig, da dette kan påvirke plassering på tomta, hvordan rom organiseres i forhold til hverandre m.v.

Sak til Formannskap og Kommunestyret i oktober/november. Her vil også oppjusterte kostnadstall bli presentert. Dette er IKKE endelig måltall, men vil gi et bedre grunnlag for hva som bør innarbeides i økonomiplanen.

Endelig vedtak om bygging og målpris skal fremdeles gjøres sommeren/høsten 2027.
