Stian Brandan MASKINSERVICE

ID	Aktivitetsnavn	% fullført	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
1	**Fremdriftsplan: VA Tollmoen**	**0%**	**166 dager?**	**ti 16.02.21**	**ti 02.11.21**	
2	Anbud: Innleveringsfrist	0%	1 dag	ti 16.02.21	ti 16.02.21	
3	Tildeling	0%	1 dag	on 17.02.21	on 17.02.21	2
4	Karenstid	0%	7 dager	to 18.02.21	fr 26.02.21	3
5	Kontraktssignering	0%	1 dag	on 03.03.21	on 03.03.21	4AS+2 dager
6	Tidligste oppstart	0%	1 dag?	to 04.03.21	to 04.03.21	5
7	Delfrist: klart for asfalt	0%	1 dag	to 16.09.21	to 16.09.21	
8	Frist: Ferdigstillelse	0%	1 dag	ma 01.11.21	ma 01.11.21	
9	**Forberedene aktiviteter**	**0%**	**82 dager**	**fr 26.02.21**	**ma 28.06.21**	
10	Planlegging og administrative aktiviteter	0%	21 dager	fr 26.02.21	fr 26.03.21	6AS-5 dager
11	Prosjektering	0%	50 dager	to 25.03.21	on 09.06.21	10AS-2 dager
12	Tilrettelegging/bestilling materiell ect	0%	10 dager	to 10.06.21	on 23.06.21	11
13	Tilrigging	0%	3 dager	to 24.06.21	ma 28.06.21	12
14	**1. Vålemogata**	**0%**	**58 dager**	**on 23.06.21**	**fr 01.10.21**	
15	VA og trekkerør	0%	17 dager	on 08.09.21	to 30.09.21	28
16	Testing av VA	0%	1 dag	fr 01.10.21	fr 01.10.21	15
17	Heving av brønntopper	0%	7 dager	on 23.06.21	to 01.07.21	19AS-10 dager
18	**2. Bølundsgata/Ivar Våles gate**	**0%**	**39 dager**	**ma 05.07.21**	**to 16.09.21**	
19	Provisorisk vannforsyning	0%	2 dager	ma 05.07.21	ti 06.07.21	11AS+17 dager
20	Riving og fjerning	0%	1 dag	ti 06.07.21	ti 06.07.21	19AA
21	VA og trekkerør	0%	35 dager	on 07.07.21	ti 14.09.21	19
22	Testing av VA	0%	5 dager	on 08.09.21	ti 14.09.21	21AA
23	Vegarbeider	0%	5 dager	fr 10.09.21	to 16.09.21	21AS-3 dager
24	**3.Grubbegata/Hageskogen**	**0%**	**38 dager**	**ti 06.07.21**	**to 16.09.21**	
25	Provisorisk vannforsyning	0%	2 dager	on 07.07.21	to 08.07.21	19
26	Riving og fjerning	0%	1 dag	ti 06.07.21	ti 06.07.21	20AA
27	VA og trekkerør	0%	26 dager	fr 09.07.21	fr 03.09.21	25
28	Testing av VA	0%	2 dager	ma 06.09.21	ti 07.09.21	27
29	Vegarbeider	0%	9 dager	ma 06.09.21	to 16.09.21	27
30	**Andre aktiviteter**	**0%**	**33 dager**	**fr 17.09.21**	**ti 02.11.21**	
31	Istandsetting og supplerende aktiviteter	0%	25 dager	fr 17.09.21	to 21.10.21	29
32	Nedrigg	0%	8 dager	fr 22.10.21	ti 02.11.21	31

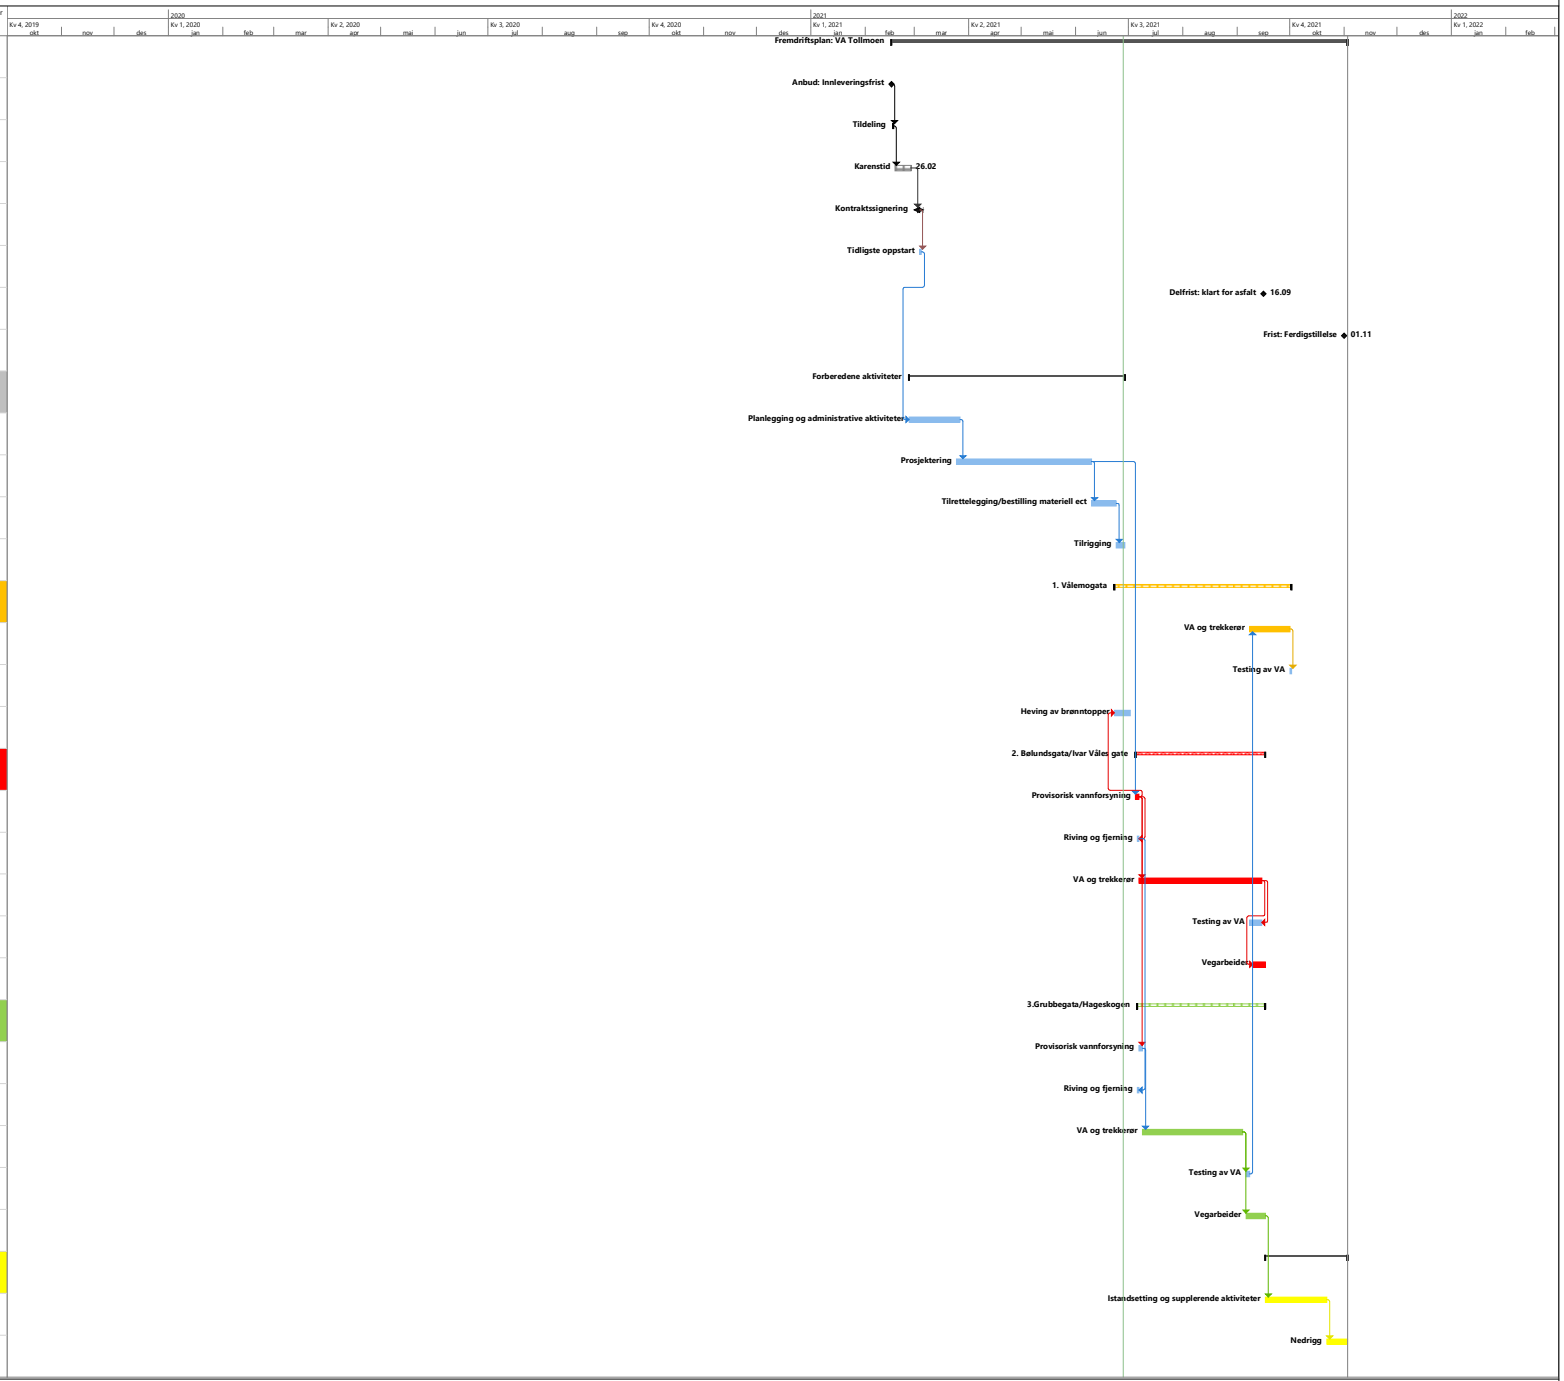

Prosjekt: E6 TS-tiltak Selsverket
Byggherre: Statens vegvesen

Aktivitet | Delig | Milepæl | Sammendrag | Prosjektsammendrag | Inaktiv aktivitet | Inaktiv milepæl | Inaktivt sammendrag | Manuell aktivitet | Bare varighet | Manuell sammendragsfremheving | Manuelt sammendrag | Bare start | Bare slutt | Eksterne aktiviteter | Ekstern milepæl | Tidsfrist | Fremdrift | Manuell fremdrift
